

Vision Lofsdalen

Förfrågan gällande uppdrag som team leader eller stigbyggare

1. Allmän information

1.1 Beskrivning

Lofsdalsfjällens Turistnärings Ekonomisk Förening (nedan kallad LTEF) begär in anbud för en grävmaskinist till projekt Vision Lofsdalen. Vision Lofsdalen är ett projekt som har beviljats bidrag från Tillväxtverket (Europeiska regionala utvecklingsfonden), Region Jämtland Härjedalen och Härjedalens kommun. Projektet pågår från 1 januari 2020 till 31 december 2022.

Vid bedömningen av anbud kommer LTEF tillämpa utvärderingsgrunden *bästa förhållandet mellan pris och kvalitet*.

Anbudet gäller för kontrakt som Team leader eller stigbyggare. Se respektive delar nedan beroende på vad ni är intresserade av för uppdrag.

1.2 Företagsinformation

Lofsdalsfjällens Turistnärings Ekonomisk Förening
Olsvensbacken 6
840 85 Lofsdalen

Organisationsnummer: 769624-8215

Lofsdalsfjällens Turistnärings Ekonomisk Förening (nedan kallad LTEF).

1.3 Ansvarig

Projektledare: Helena Fjellgren
E-post: visionlofsdalen@gmail.com
Telefonnummer: 070-33 44 274

2. Upphandlingsföreskrifter

2.1 Upphandlingsform

Upphandlingen följer det särskilda inköpsförfarande baserat på upphandlingsprinciperna i LOU (lagen om offentlig upphandling).

Upphandlingsprinciperna som kommer efterföljas är icke-diskriminering, likabehandling, ömsesidigt erkännande, proportionalitet och öppenhet enligt 4 kap. 1 § LOU.

Datum 2021-01-25

Den här upphandlingen kommer att konkurrensutsättas vilket innebär att vi kommer tillfråga minst två leverantörer samtidigt med samma förfrågningsunderlag.

Förfrågan och svar från er ska ske skriftligt via mail och den dokumentationen kommer att sparas. I den skriftliga kommunikationen ska parternas namn, pris, beskrivning av varan/tjänsten och tid för leverans specificeras i anbudet.

Telefonsamtal och/ eller videosamtal kommer att dokumenteras skriftligt genom tjänsteanteckningar.

2.2 Sista anbudsdag

Team leader: Sista anbudsdag för team leader är 2020-02-14, anbud inlämnade efter det datumet kommer inte att behandlas. Anbudet kommer öppnas löpande.

Stigbyggare: Sista anbudsdag för team leader är 2020-04-30, anbud inlämnade efter det datumet kommer inte att behandlas. Anbudet kommer öppnas löpande.

2.3 Anbudets omfattning

Anbudet ska lämnas för hela eller delar av uppdraget för stigbyggare team leader eller stigbyggare.

2.4 Anbudets giltighetstid

Anbudet ska vara giltigt till och med 2021-08-01

2.5 Förtydligande/ kompletteringar av upphandlingsdokument

Är det något i anbudet som är oklart eller behöver kompletteras ska det skickas via en skriftlig förfrågan till visionlofsdalen@gmail.com. Dessa förtydliganden kommer sedan kommuniceras ut samtidigt till alla via mail.

2.7 Sekretess

Enligt offentlighets och sekretesslagen (SFS 2009:400) gäller absolut sekretess för upphandlingen tills antaget anbud. Därefter kan uppgifterna bli offentliga, om anbudsgivaren inte önskar detta ska det kommuniceras skriftligen med informationen ni inte önskar offentliggöra.

2.8 Meddelande om tilldelningsbeslut

Antagen anbudsgivare kommer att kontaktas via e-post.

2.9 Avtal

Efter meddelande om tilldelningsbeslut kommer kontrakt att skrivas med vald anbudsgivare. För att kontraktet ska vara giltigt ska det skrivas under utav VD i LTEF samt anbudsgivare.

2.10 Språk

Anbudssvar ska lämnas på svenska

3. Krav på leverantör

3.1 Uppdragsbeskrivning

Datum 2021-01-25

Vision Lofsdalen innefattar byggnationen av en helt ny arena för mountainbikecykling. Området är högt beläget med lite höjdskillnad. Det finns två sätt att komma till området genom så kallade access points som nås antingen med bil eller genom sittlift. Mellan dessa två access points ska en tillgänglighetsanpassad led byggas som alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna använda.

Målet med arenan är att skapa en ny reseanledning till Lofsdalen, det är LTEF:s önskan att skapa ett av Sveriges bästa cykelområden. Området kommer arbeta efter ett tema som förknippas med Lofsdalen vilket är kärlek, frihet, lugn och orörd natur. Då orörd natur är ett av Lofsdalens signum är det väldigt viktigt att cykellederna byggs med hänsyn till naturen och smälter in naturligt.

Målgruppen är den aktiva barnfamiljen där vi får möjlighet att skapa nya cyklister. Det innebär att det behöver vara ett stort fokus på gröna och blå leder och att dessa inte får vara jobbiga att cykla (dvs innefatta för många höjdmeter).

Lederna kommer byggas efter principen multileder, det betyder att lederna ska kunna användas till andra aktiviteter året runt. Som skidspår på vintern eller snöskoleder. En del leder bör även skapas för funktionshindrade, dvs. att även rullstolar ska kunna framföras längs vissa leder, LTEF ansvar för att få fram testpersoner samt utrustning till dessa leder.

Ledområdets knutpunkt kommer vara runt en grillplats med servicebyggnad, vindskydd och aktiviteter för barnen, det är därför bra om flera olika leder kan nås från knutpunkten samt att ett fokus läggs på gröna leder runt knutpunkten.

Då ledområdet kommer kunna nås från sittliften blir det även ett komplement till Lofsdalen Bike Park som har 16 km downhilleder.

Under projektet kommer ni att samarbeta i ett team på ca. fem personer som kommer bestå utav fem stigbyggare varav en är team leader samt en till två grävmaskinister. Ni kommer att arbeta efter direktiven från en leddesigner, markägare och projektledare. Till din hjälp har du projektledare, styrgrupp samt Lofsdalsspår som ansvarar för Lofsdalens spår och leder.

Plats

Lofsdalen, Härjedalen

Uppdragsperiod

Team leader: Uppdraget börjar 1 maj och pågår till sista september 2021 och samma period 2022.

Stigbyggare: Uppdraget börjar 1 juni och pågår till sista september 2021 och samma period 2022.

3.2 Arbetsuppgifter team leader

Som team leader ansvarar du för att planera och leda arbetet för ditt team på fyra stigbyggare och två grävmaskinister. Arbetet är väldigt självständigt men det är viktigt att ni har bra kommunikation med leddesigner, grävare, projektledare och Lofsdalsspår. I dina ansvarsområden ingår:

Projektstart:

- Inventering av området
- Projektstartmöte
 - genomgång av arbetet och genomgång av kartor
 - Samarbete med grävmaskinister och stigbyggare
 - Förmedla visionen med projektet för att motivera teamet och visa på tydliga målsättningar gällande vilka sträckor som ska färdigställas och när.
- Schemaläggning tillsammans med stigbyggare och grävmaskinister
- Kontroll av utrustning och att utrustningen finns på rätt plats vid behov
 - Att all utrustning finns på plats vid projektstart
 - Torra handskar
 - Hela verktyg
 - Att verktygen transporteras till nästa arbetsplats på ett effektivt sätt
 - Fungerande arbetskläder
- Ansvarar för att lägga upp arbetet så att ni kan arbeta självständigt vid t.ex. sjukdomar och ledighet.
- Strategier och prioriteringar kring ledsträckor
- Ansvarar över arbetsmiljön och genomgång utav säkerhetsföreskrifter
- Ansvarar för att arbetad tid loggas via en app dagligen för kontroll mot budget.

Masterplan och samarbete med leddesignern och Lofsdalsspår

- Team leadern ska se till att följa masterplanen och instruktioner från leddesignern. Vid stora avvikelser från masterplanen ska projektledare kontaktas pga markägaravtal och tillstånd från länsstyrelsen.
- Vid problem ansvarar team leadern för att arbetet inte stannar av utan att ni istället kommer på andra innovativa lösningar/ arbetsuppgifter.
- Samordnar och koordinerar ert arbete tillsammans med grävorna (t.ex. ser till att ni har huggit ner träd innan grävaren kommer, paddar vid behov, återtorvar osv.
- Bistår grävmaskinisterna med hjälp.
- Vid frågor om leddesign ansvarar du för att ta kontakt med leddesignern, genom telefon och/eller videosamtal.
- Som team leader är du ansvarig för att grävmaskinisterna förstår tänket kring cykelleder och meddelar projektledaren direkt om svårigheter skulle uppstå med någon grävmaskinist.

Ekonomi

- Kontrollera grävarens och stigbyggarnas timmar mot budget och se till att samarbetet mellan grävare och stigbyggare fungerar
- Se till att grävare och ledbyggare arbetar kostnadseffektivt
- Följ tidsplanen och rapportera avvikelser/ extra kostnader som avviker från budget

Kostnadseffektivitet och innovation

- Problemlösare - vid problem för ledteamet, leddesigner och/eller grävare ansvarar du för att se till att problemet blir löst på ett effektivt sätt.

- Kontaktar projektledare vid större problem med projektet t.ex. maskinhaveri, ingen arbetskraft, håller ej uppsatt tidsram m.m

Digitalisering

- Lägga in de färdiga lederna på Strava, Trailforks, Fatmap, Lofsdalen, Relive, Runkeeper och döpa dem till namnen bestämda av projektgruppen.

Arbete i fält

- Stigbyggare ska arbeta efter masterplanen och se till att arbetet underlättas för grävmaskinisterna.
- Arbetsuppgifter inkluderar spångning och gräva led med spade, hacka, såga ner träd, padda, flytta sten, klippa grenar, rötter och återtorva, snickra m.m.
- Cykla igenom lederna.
- Ansvarar för att sätta upp hänvisningsskyltar
- Ansvarar för att cykla den färdiga leden med Karinssportbod, Destination Lofsdalen och fjällanläggningen
- Ansvarar för aktivitetsområdet/centret och de planer som projektgruppen planerar där.

Kontakt med projektledare

- Regelbundna avstämningsmöten med projektledaren gällande antalet arbetade timmar och vart ni befinner er förslagsvis varannan vecka.

Vi ser gärna att du har

- Motorsågsörkort
- Fyrhjulingskort
- Utbildning i första hjälpen
- Erfarenhet av att arbeta utomhus
- Stor erfarenhet av cykling

Innan projektstart bör du ha:

- Studerat följande film på youtube:
<https://www.youtube.com/watch?v=XxTM3iuRzZk>
- Läst IMBA:s direktiv för ledbyggnationer:
http://www.wnymba.org/static/report/trail_manual/BBT_Manual.pdf
- Förstått leddragningen genom att studera masterplanen tillsammans med leddesignern
- Läst komplementeringen till Länsstyrelsen gällande avrinning och hållbarhet och se till att det efterföljs genom att kommunicera det med leddesigner
- Läst utlåtandet från naturvärdesinventerare samt arkeolog
- Läst projektansökan
- Förstått projektplanen så arbetet kan starta ute i fält från dag 1

3.3. Arbetsuppgifter stigbyggare

Arbete i fält

- Stigbyggare ska arbeta efter masterplanen och direktiven från team leadern samt se till att arbetet underlättas för grävmaskinisterna.
- Arbetsuppgifter inkluderar spångning och gräva led med spade, hacka, såga ner träd, padda, flytta sten, klippa grenar, rötter och återtorva, snickra m.m.

Vi ser gärna att du har

- Motorsågsörkort
- Fyrhjulingskort
- Utbildning i första hjälpen
- Erfarenhet av att arbeta utomhus
- Stor erfarenhet av cykling

Innan projektstart bör du ha:

- Studerat följande filmer på youtube:
<https://www.youtube.com/watch?v=XxTM3iuRzZk>
<https://www.imbikemag.com/technique/trail-maintenance/trail-therapy/>
<https://www.imbikemag.com/technique/trail-maintenance/trail-therapy/>
- Läst IMBA:s direktiv för ledbyggnationer:
http://www.wnymba.org/static/report/trail_manual/BBT_Manual.pdf
- Förstått leddragningen genom att studera masterplanen tillsammans med leddesignern
- Läst komplementeringen till Länsstyrelsen gällande avrinning och hållbarhet och se till att det efterföljs genom att kommunicera det med leddesigner
- Läst utlåtandet från naturvärdesinventerare samt arkeolog
- Läst projektansökan
- Förstått projektplanen så arbetet kan starta ute i fält från dag 1

3.4 Mervärden (tilldelningskriterier)

Förutom anbudets ska krav (punkt 3.2) kommer även anbudsgivarens kompetens att bedömas utifrån från mervärden listade nedan.

Vid värderingen av kvalité värdesätter vi det lika högt som ett lågt pris.

3.3.1 Utvärdering erfarenhet

Bifoga en referens från tidigare arbetsplats

Bifogat dokument ska innehålla följande:

- Namn på referenskund/ uppdragsgivare samt organisation/företag.
- Kontaktperson med kontaktuppgifter (telefonnummer och epost)
- Kort beskrivning av minst två tidigare arbeten.

3.3.2 Utvärdering hållbarhet

Hållbarhet och värnande om miljön är väldigt viktigt för det här projektet. Därför bör ni vara väl införstådda i de direktiv som anges av IMBA (International Mountain Bicycling Association) för att bygga hållbara leder. Ett stort fokus måste ligga på vattenavrinning där det är önskvärt från LTEF:s sida att så långt det är möjligt enbart använda naturliga material som stenkistor och andra principer för avrinning.

Datum 2021-01-25

Det är av största vikt att området bevaras och att lederna smälter in naturligt i naturen. Därför önskar LTEF att ni instruerar teamet i att de ska torva av vid grävning för att sedan åter torva längs med lederna. Vid de tillfällen när material behöver grävas fram ska dessa materialgropar återställas.

Intyga att ni kommer arbeta efter dessa direktiv.

3.3.3 Utvärdering cykelerfarenhet

Då vi ska skapa ett av Sveriges bästa cykelområden är det av stor vikt att ni besitter en stor erfarenhet av cykling.

Beskriv ert cykelintresse.

3.3.4 Utvärdering ekonomisk stabilitet

LTEF önskar se att ni har den finansiella förmågan som krävs för att utföra det kontrakt som ska tilldelas. Vi vill se er UC rating/riskklassning som då kan ge en god bild av ert företags ekonomiska situation alternativt föregående års balans- och resultatrapport eller en förklaring till hur ni kommer klara av det här uppdraget baserat på er nuvarande ekonomiska situation.

4. Pris

Ange pris per timme i SEK ex moms, samt för vilken tjänst som stigbyggare det gäller, team leader eller stigbyggare.

Alla övriga kostnader som restid, traktamente ska också specificeras.

5. Antagande av anbud - *bästa förhållandet mellan pris och kvalitet*

LTEF kommer att anta det anbudet som uppfyller samtliga krav på punkt 3.2 samt har det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet, där hög kvalitet kommer att värderas lika högt som ett lågt pris.

LTEF omfattas inte av LOU och beslutet kan därför inte överklagas.

Får LTEF bara in anbud över vår budget, eller att anbuderna inte uppfyller våra krav, har vi rätt att skicka ut upphandlingarna på nytt.

6. LTEF:s åtagande

- LTEF ser till att alla tillstånd och avtal är på plats inför er ankomst till Lofsdalen.
- LTEF ser till att arbetsteamet är på plats bestående utav två - tre grävmaskinister och fyra till fem ledbyggare varav en är team manager, projektledaren hjälper till att starta upp arbetet och se till att ni har allt ni behöver.

Bilagor



Karta över området.

De streckade lederna är planerade leder och de heldragna lederna inom Lofsdalen Fjällpark MTB är färdiga leder.

Moodboard



Förslag på lednätets utformning sett från luften, knutpunkten är vindskyddet/grillplatsen.



Bild på leden Miss Piggy - ett fokus är att alla leder ska gå runt instagram vänliga point of interests - eller som i det här fallet - ha en speciell utformning som lockar till delningar på sociala medier.

Datum 2021-01-25



Sherwood forest Trysil - ett annat exempel på en instagram vänlig led som besökarna minns. Se även video: <https://youtu.be/ugaqIFf84mU>



En till led för inspiration.

Datum 2021-01-25



Lucky ducky - en grön led för den aktiva barnfamiljen. Se gärna video:
https://youtu.be/Z9-_lupQYE8



Datum 2021-01-25

Det är viktigt att det hela tiden händer någonting längs leden så att besökaren får ett konstant flow.



De blå och gröna lederna måste vara enkla att cykla. Det är väldigt viktigt att tänka på att det inte får vara mycket höjdskillnad vid byggnationen av gröna och blå leder.



Datum 2021-01-25



Alla röda och svarta leder ska börjas med ett riktigt svårt parti för att avskräcka sämre cyklister.



Korta, svårare avstickare gör upplevelsen av leden väldigt bra.

Datum 2021-01-25



Gröna och blå leder behöver många svängar, här är ett mindre bra exempel från Åre där den gröna leden är väldigt rak och blir en mindre rolig bana.




Bild på en av våra egna leder. Observera hur orörd naturen ser ut på sidorna om leden. Det är det här vi vill uppnå.

Datum 2021-01-25



Bild över området. Området ligger högt och torrt. Det finns en del fjällbjörkar och buskar samt en hel del naturliga stigar. Det är stor risk för mycket sten i området.



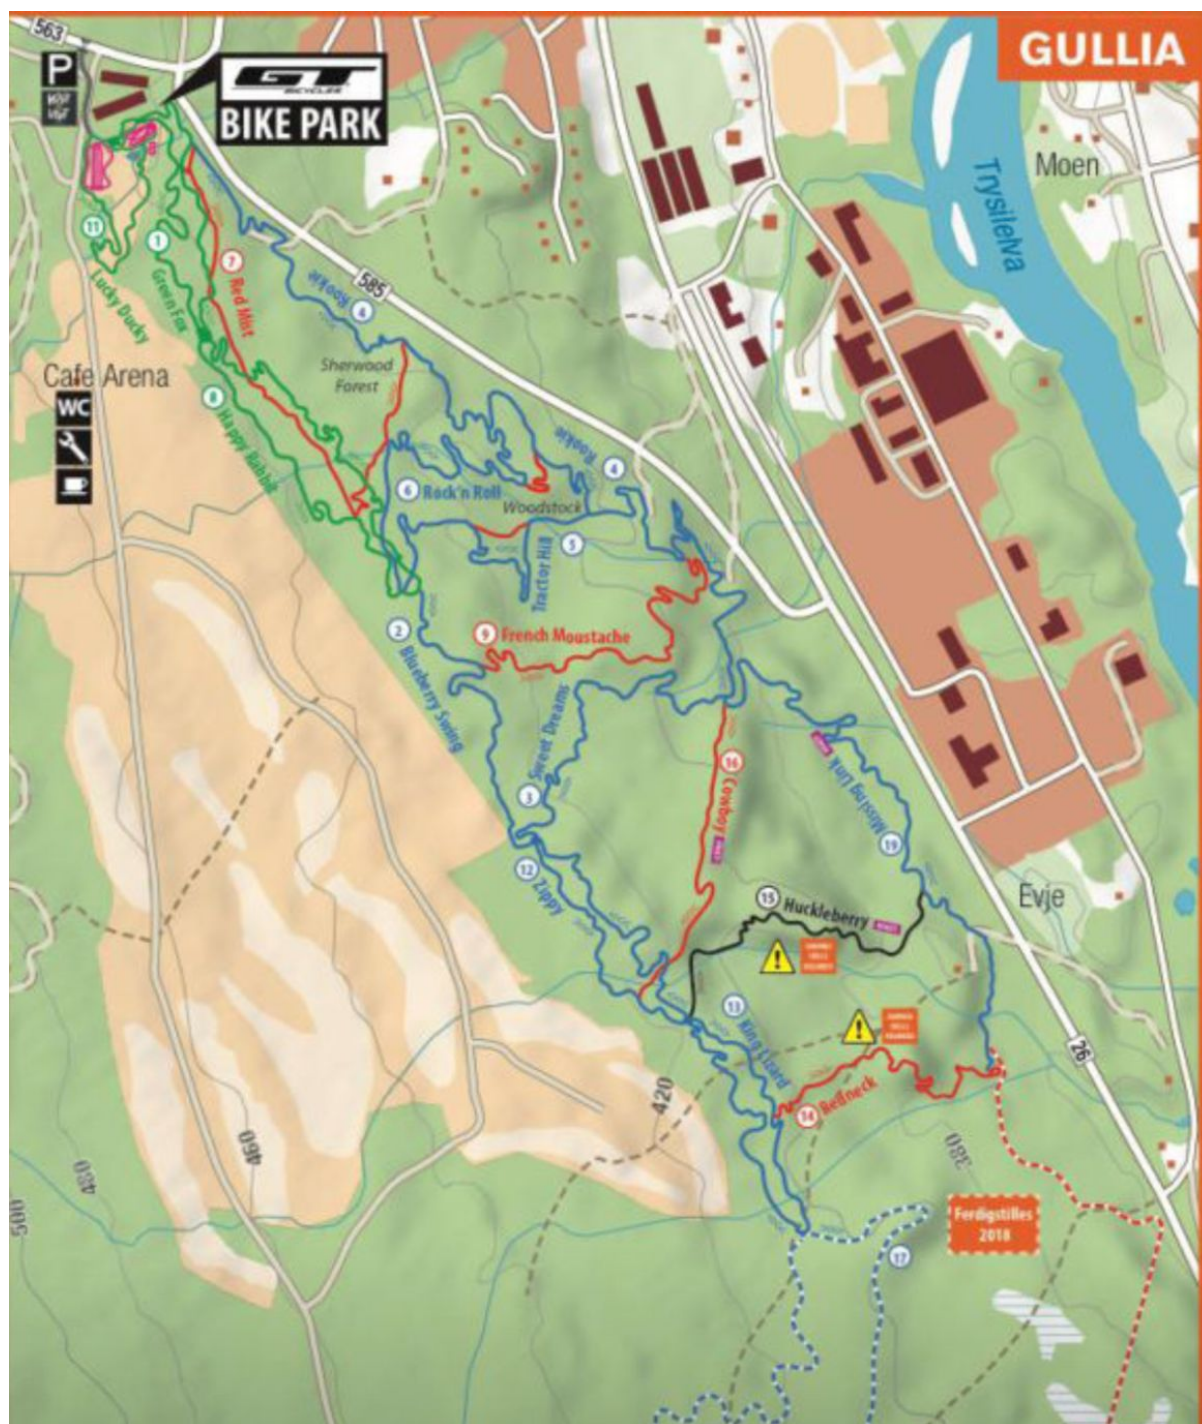

Ledkarta över Gullia

Datum 2021-01-25



Temapark - inspiration till en karta för barn över området.
